201	Контролер за отопление на два отоплителни кръга и бойлер	бр.	1						позиция 201 започва след позиции 165-200
	Противопожарна защита								
202	Пожарогасител прахов 6кг	бр.	2						позиции 202-204 се доставят в края на подобект 2
203	Пожарогасител прахов 12кг	бр.	2						
204	Противопожарно одеало-тежък тип,мин.1.5/1.5м	бр.	2						
	Демонтажни работи								
205	Демонтаж черни тръби 1/2"	мл	16						позиции 205-210 започват 2 дни след началото на позиции 99-110
206	Също, но 3/4"	мл	22						
207	Също, но 1"	мл	18	кортач 1 бр	1	62	65	4 дни	
208	Също, но 1 1/4"	мл	26						
209	Също, но 1 1/2"	мл	38						
210	Също, но 2"	мл	42						
	Газификация								
211	Тръба стоманена БДС EN 10216-I-L290GA Ø42,4x3.6 St,	мл	10						позиции 211-225 започват след позиции 205-210
212	Тръба стоманена БДС EN 10216-I-L290GA Ø33.7x3.6 St,	мл	6						
213	Тръба стоманена БДС EN 10216-I-L290GA-21,3x3.2 St-	мл	8						
214	Тръба PE-HD>(80), SDR 11, за газ 4 bar, Ø40x3,7,	мл	54						
215	Тръба черна газова 4" - 108x4 - за обсадна,	мл	3						
216	Преход PE/St 40x42,4 .	бр.	2						
217	Колено PE Ø40 ел.завар.	бр.	3						
218	Колено за заварка 11/4" - док. за качество ANSI B.16.9 STD, .	бр.	6	перфоратор 1 бр, винтоверт 1 бр, кортач 1 бр, машина за заваряване на тръби 1 бр	4	66	75	10 дни	
219	Колено за заварка 1" - док. за качество ANSI B.16.9 STD, .	бр.	7						
220	Колено за заварка 1/2" - док. за качество ANSI B.16.9 STD,	бр.	8						
221	Тройник безшевен 90о за заварка 11/4"	бр.	1						
222	конзола /по детайл/	бр.	8						
223	Стоманен безшевен концентричен намалител 11/4"x 1" , за заварка	бр.	1						
224	Стабилизатор за газ 3/4" с вграден филтър G2, версия A pax.max=100mbar, pизх.= 20 mbar	бр.	1						
225	Стабилизатор за газ 1" с вграден филтър G2, версия A pax.max=100mbar, pизх.= 20 mbar ,.	бр.	1						
226	Продухване тръбопровод	мл	67						позиция 226 започва след позиции 211-225
227	Холендър преходен 11/4" ,	бр.	3						позиции 227-245 започват успоредно с позиции 211-225
228	Нипел единичен 11/4" , за заварка	бр.	4						
229	Нипел единичен с резба 1" , за заварка	бр.	8						
230	Кран сферичен за природен газ 1" PN4	бр.	2						
231	Кран сферичен за газ 1 1/4" PN4	бр.	2						
232	Филтър за газ 1 1/4" Y Ж/Ж с филтърен елемент(0,4mm - 0,3mm) за горими газове GO 180SO9	бр.	1						
233	Кран сферичен за природен газ 1/2" PN4	бр.	3						
234	Термичен предпазител 1" BON TA5 - G.0265N36	бр.	2						
235	Гъвкава връзка за газ 1" M-F L = 0,4м	бр.	2						
236	Магнет вентил за газ 1 1/4" , NC . 230V .	бр.	1						
237	Табло за монтаж на магнет вентил	бр.	1	перфоратор 1 бр, винтоверт 1 бр	2	66	75	10 дни	
238	Тръби димоотводни	мл	28						
239	Доставка на вентилатор взривозащитен ф320мм,600 m3/h,40 Pa,950мин,монтаж по схема A входяща ел. мощност N=80W; 230V, small; IP 55; клас на изолация F, вградена термична защита,	бр.	1						
240	Опора(скоба) за укрепване на тръбопровод 1"мм, комплект с дюбел за бетон(за тухлена стена)	бр.	8						
241	Опора(скоба) за укрепване на тръбопровод 1/2"мм, комплект с дюбел за бетон(за тухлена стена)	бр.	7						
242	Опора(скоба) за укрепване на тръбопровод 11/4", комплект с дюбел за бетон(за тухлена стена)	бр.	5						
243	Лента обозначителна с метална нишка (жълта)	мл	60						
244	Пенополиуретан, флакон	бр.	3						
245	Щуцер за заварка 1/2" за хидравл.изпитване + тапа1/2"	бр.	1						
246	Изпитване газопровод на якост и плътност	мл	67						позиция 246 започва след позиции 227-245
247	Грунд	кг	3						позиции 247-248 започват 2 дни преди края на позиция 246
248	Емайл лак , жълт за двукратно нанасяне	кг	3						
249	Продухване газопровод,	мл	67						позиция 249 започва успоредно с позиция 246
250	Централа за газ със звукова и светлинна сигнализация. Монтаж на 20 см от тавана, датчик за метан,	бр.	1						позиции 250-251 започват успоредно с позиции 247-248
251	Промишлена сирена, бр.	бр.	1						
252	Пробиване отвори в бетонна стена бр.	бр.	2	кортач 1 бр	1	60	62	3 дни	позиции 252-253 започват 2 дни преди позиции 205-210
253	Пробиване отвори в тухлена стена бр.	бр.	4						
254	Тръба 32 PE-конденз	мл	8						позиция 254 започва 7 дни след началото на позиции 227-245
255	Изкоп шир.0,80 дълб.1 м м³	м3	42	кортач 1 бр, самосвал 1 бр	2	60	62	3 дни	позиции 255-258 започват успоредно с позиции 252-253
256	Разбиване настилка м²	м2	5						
257	Доставка пясък м³	м3	18						
258	Извозване пръст м³	м3	20						
259	Направа мет.конструкция	кг	150						позиции 259-262 започват успоредно с позиции 227-245
260	Възстановяване комин	бр.	1						
261	Грундиране	м2	6						
262	Боядисване с емайл лак двукратно м²	м2	12						
263	72- часова проба	бр.	1						позиция 263 започва след позиция 249

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 89 от ЗЗЛПЧ вр.в. връзка с чл. 39а, ал. 1 от ЗОТ

264	Щуцер за заварка за хидравлични изпитвания	м2	1						позиции 264-269 започват успоредно с позиции 259-262
265	Газсигнализатор бр.	бр.	2						
266	Сирена бр.	бр.	1						
267	Изолация димоотводни тръби	мл	25						
268	Шапка за димоотводни тръби	бр	2						
269	Полиетиленова тръба ф 32 мм	мл	8						
V	ЕЛЕКТРО								
270	Демонтаж осв.тела	бр.	162						позиция 270 започва 5 дни преди позиция 49
271	Доставка осв.тела LED 120 см.,18 VV, IP 34	бр.	18						позиции 271-274 започват в последния ден на позиция 51
272	Доставка осв.тела LED 120 см., 18 VV, IP 65	бр.	2						
273	Доставка осв.тела LED 60 см., 10 VV, IP 34	бр.	23						
274	Доставка осв.тела LED плафониери Ф300 24VV, IP21	бр.	101						
275	Монтаж осв.тела	бр.	162	винтоверт 1 бр	1	75	84	10 дни	позиция 275 започва след позиция 276
276	Лампени изходи със СВТ в PVC профили, открито до 6м	бр.	25						позиция 276 започва след позиции 271-274
277	Демонтаж ключ открит, IP34	бр.	15						позиция 277 започва след позиция 270
278	Монтаж ключ открит, IP34	бр.	15	винтоверт 1 бр	1	85	85	1 ден	позиция 278 започва след позиция 275
	Силова инсталация								
279	Демонтаж профил PVC 20/20	м.	60						позиция 279 започва 1 ден преди позиции 264-269
280	Монтаж профил PVC 20/20	м.	60	винтоверт 1 бр	1	67	71	5 дни	позиция 280 започва след позиция 279
281	Демонтаж проводник СВТ 3х1.5 кв.мм.	м.	78						позиция 281 започва успоредно с позиция 279
282	Монтаж проводник СВТ 3х1.5 кв.ми.	м.	78	винтоверт 1 бр	1	67	71	5 дни	позиция 282 започва успоредно с позиция 280
283	Свързване	бр.	12						позиция 283 запова успоредно с позиция 282
284	Контактен изход със СВТ в PVC профили 6м	бр.	8	винтоверт 1 бр	1	72	72	1 ден	позиции 284-286 заповат след позиция 283
285	Контакт ШУКО открит IP34	бр.	8						
286	Монтаж контакти шуко открити	бр.	8						
287	Демонтаж съществ.предпазители	бр.	190						позиция 287 запова успоредно с позиция 281
288	Доставка авт.предпазители C60N 25А	бр.	160	винтоверт 1 бр	1	67	71	5 дни	позиции 288-293 заповат успоредно с позиция 283
289	Доставка авт.предпазители C60N 63А	бр.	30						
290	Шина тоководеща 1м, трифазна	бр.	21						
291	Монтажна шина 2м	бр.	7						
292	Монтаж предпазители	бр.	190						
293	Означаване табла	бр.	7						
294	Проверка заземление на ГРТ	бр.	1						позиция 294 започва след позиции 284-286
	Мълниезащитна уредба								
	Демонтажни работи								
295	Демонтаж на бетонна стомана Ф 8 мм.	м.	220						позиции 295-297 започват успоредно с позиция 3'
296	Демонтаж на Колчета	бр.	220						
297	Демонтаж на иртъ 4 м.	бр.	1						
298	Доставка мълниеприемник с изпреварващо действие	бр.	1	перфоратор 1 бр, къртач 1 бр	2	18	18	1 ден	позиции 298-299 заповат след позиция 9'
299	Монтаж мълниеприемник с изпреварващо действие	бр.	1						
300	Проводник алум.Ф8 с PVC	м.	60			18	18	1 ден	позиция 300 започва успоредно с позиция 299
301	Крепежни елементи за скатен покрив	бр.	30			19	19	1 ден	позиции 301-307 започват след позиция 300
302	Полагане проводник	м.	60			19	19	1 ден	
303	Направа заземление с преходно съпротивл.до 20ома	бр.	2			19	19	1 ден	
304	Доставка на кутия метална ревизионна кутия 200/400/100	бр.	2						
305	Монтаж на кутия метална ревизионна кутия 200/400/100	бр.	2	винтоверт 1 бр	1				
306	Доставка на прав съединител	бр.	2						
307	Монтаж на прав съединител	бр.	2						
308	Пусковоналадъчни работи	бр.	2						позиции 308-309 започват след позиции 301-307
309	Измерване на съпротивление на мълниезащита	бр.	1						
VI	Пожарна безопасност								
	Пожароизвестителна инсталация								
	ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ								
310	Доставка и полагане на кабел J-Y/L/Y 2х0,50 мм	м.л.	600	перфоратор 1 бр винтоверт 1 бр	2	30	39	10 дни	позиции 310-312 започват 2 дни преди позиция 370
311	Доставка и полагани на кабелен канал 25х16,5мм	м.л.	300						
312	Доставка и полагани на кабелен канал 100х100х50мм	м.л.	10						
	ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ								
313	Пожароизвестителна централа SmartLine 020/4 - 4 зони	бр.	1						позиции 313-322 започват след позиция 275
314	Разширител 8 зони за SmartLine 020/4	бр.	1						
315	Акумулаторна батерия 12v/7Ah	бр.	2						
316	Пожароизвестител оптично-димен D 9000 с монтажна основа D 9000	бр.	53						
317	Пожароизвестител термодиференц D 9000T с монт. Основа D 9000	бр.	3						
318	Пожароизвестител комбиниран D 9000SR с монт. Основа D9000	бр.	1						
319	Пожароизвестител ръчен с нечуплив елемент Teletek	бр.	4						
320	Електронна сирена с флаш вътрешна SV2002F	бр.	4						
321	Електронна сирена с флаш лампа AH-03127-BS	бр.	1						

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

000405

322	Изнесен светлинен сигнализатор	бр.	8						
	МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ								
323	Пожароизвестителна централа SmartLine 020/4 - 4 зони	бр.	1						
324	Разширител 8 зони за SmartLine 020/4	бр.	1						
325	Пожароизвестител оптично-димен с монтажна основа	бр.	53						
326	Пожароизвестител ръчен с нечупливо елемент IC0020 INIM	бр.	4						
327	Пожароизвестител термодиференц D 9000T с монт. основа	бр.	3						
328	Електронна сирена с фланш вътрешна SV2002F	бр.	4	перфоратор 1 бр, винтоверт 1 бр	2	86	90	5 дни	позиции 323-333 започват след позиции 313-322
329	Електронна сирена с фланш лампа AH-03127-BS	бр.	1						
330	Изнесен светлинен сигнализатор	бр.	8						
331	Суха разделка на кабел	бр.	68						
332	Прозвънване жилата на контролните кабели	бр.	68						
333	Свързване на проводник към съоръжение без ухо	бр.	68						
334	Единични изпитания	бр.	10						позиция 334 започва след позиции 323-333
335	Направа на отвор в бетон и/или тухла	бр.	59	къртач 1 бр	1	16	17	2 дни	позиция 335 започва след позиции 144-145
336	72 часова проба	бр.	1						позиция 336 започва след позиция 334
	Противопожарно отклонение								
337	Изкопни работи	м2	2						
338	Демонтаж водомерен възел 10 м3	бр	1						
339	Изграждане на водомерна шахта	бр	1						
340	Изграждане на шахта за ПК 2"	бр	1						
341	Доставка и монтаж на комбиниран водомер 50 м3	бр	1						
342	Доставка и монтаж ПК 2"	бр.	1	перфоратор 1 бр, къртач 1 бр	2	11	15	5 дни	позиции 337-347 започват 3 дни след началото на позиция 57
343	Доставка и монтаж поцинкована тръба 2"	м.л	3						
344	Доставка и монтаж на СК 2"	бр.	1						
345	Доставка и монтаж на СК 2" с изрязнител	бр.	1						
346	Доставка и монтаж на филтър 2"	бр.	1						
347	Доставка и монтаж на възвратна клапа 2"	бр.	1						
	Охранителни системи								
348	Изграждане на система за контрол на достъпа, в т.ч. и окабеляване	бр.	1						позиция 348 започва успоредно с позиции 323-333
	ДГ „Мечо Пух" с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево УПИ V кв.5 община Севлиево								
А1	Архитектура								
349	Демонтаж на керемиди - етап 1	м2	448			96	96	1 ден	позиция 349 започва 93 дни след позиция 2
349'	Демонтаж на керемиди - етап 2					103	103	1 ден	позиция 349' започва след позиция 355
350	Демонтаж на съществуваща летвена обшивка -етап 1	м2	448			97	97	1 ден	позиция 350 започва след позиция 349
350'	Демонтаж на съществуваща летвена обшивка -етап 2					104	104	1 ден	позиция 350' започва след позиция 349'
351	Преглед на цялата покривна конструкция и подмяна при необходимост на компрометирани елементи в т.ч. и ребра -етап 1	м2	448			98	98	1 ден	позиция 351 започва след позиция 350
351'	Преглед на цялата покривна конструкция и подмяна при необходимост на компрометирани елементи в т.ч. и ребра -етап 2					105	105	1 ден	позиция 351' започва след позиция 350'
352	Монтаж на дъсчена обшивка над дървени ребра-дъски 2,5 см. - етап 1	м2	448			99	100	2 дни	позиция 352 започва след позиция 351
352'	Монтаж на дъсчена обшивка над дървени ребра-дъски 2,5 см. - етап 2					106	107	2 дни	позиция 352' започва след 351'
353	Полагане на мембранна хидроизолация под керемиди, включително за обръщане при комини - етап 1	м2	448			100	101	2 дни	позиция 353 започва 1 ден след началото на позиция 352
353'	Полагане на мембранна хидроизолация под керемиди, включително за обръщане при комини - етап 2					108	109	2 дни	позиция 353' започва след позиция 352'
354	Монтаж на дървени летви и контрлетви над хидроизолация.-етап 1	м2	448			100	101	2 дни	позиция 354 започва успоредно с позиция 353
354'	Монтаж на дървени летви и контрлетви над хидроизолация.-етап 2					108	109	2 дни	позиция 354' започва успоредно с позиция 353'
355	Почистване,сортиране,монтаж на здрави и допълване с нови керемиди. - етап 1	м2	448			102	102	1 ден	позиция 355 започва след позиция 354
355'	Почистване,сортиране,монтаж на здрави и допълване с нови керемиди. - етап 2					110	110	1 ден	позиция 355' започва след позиция 354'
356	Доставка и монтаж на челна дъска-етап 1	м	126			100	101	2 дни	позиция 356 започва успоредно с позиция 354
356'	Доставка и монтаж на челна дъска-етап 2					108	109	2 дни	позиция 356' започва успоредно с позиция 354'
357	Възстановяване на комини-очукване на съществуваща мазилка, зидария с тухли, консолидация, измазване с ВЦ разтвор,Доставка и монтаж на олекотени шапки за комини,Боядисване на комини с вододисперсионни бои в цвят по указание на проектанта -етап 1	бр.	6	електрическа бъркалка 1 бр	1	101	101	1 ден	позиция 357 започва 1 ден преди началото на позиция 355
357'	Възстановяване на комини-очукване на съществуваща мазилка, зидария с тухли, консолидация, измазване с ВЦ разтвор,Доставка и монтаж на олекотени шапки за комини,Боядисване на комини с вододисперсионни бои в цвят по указание на проектанта -етап 2			електрическа бъркалка 1 бр	1	109	109	1 ден	позиция 357' започва 1 ден преди началото на позиция 355'
358	Демонтаж на обшивки и поли от ПЦ ламарина около комини, стрехи и др.	м.	44						позиция 358 започва успоредно с позиция 349
358'	Изработка, доставка и монтаж на обшивки от ПЦ ламарина 0,52-0,55 мм. -етап 1								позиция 358' започва успоредно с позиция 356
358"	Изработка, доставка и монтаж на обшивки от ПЦ ламарина 0,52-0,55 мм. -етап 2			ъглошлайф 1 бр	1	108	109	2 дни	позиция 358" започва успоредно с позиция 356'
359	Обработка на видима армировка по стреха, репариране и шпакловка	м2	62	електрическа бъркалка 1 бр	1	98	99	2 дни	позиция 359 започва след позиция 375
360	Демонтаж на надулучна пола до 45 см.	м.	105,85					2 дни	позиция 360 започва успоредно с позиция 358
360'	Доставка и монтаж на надулучна пола до 45 см. - етап 1							2 дни	позиция 360' започва успоредно с позиция 358'

ъглошлайф 1 бр, ръчен циркуляр 1 бр и перфоратор 1 бр, автокран 1 бр — 4

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД вр.чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

360"	Доставка и монтаж на надулучна пена до 45 см. - етап 2			зъгошлайф 1 бр	1	108	109	2 дни	позиция 360" започва успоредно с позиция 358"
361	Очукване и възстановяване на компромитирана мазилка по бетонови стрехи	м2	18,6						позиция 361 започва успоредно с позиция 359
362	Демонтаж на съществуваща дървена стреха по калкани.	м2	42	ръчен циркуляр 1 бр	1	105	105	1 ден	позиция 362 започва успоредно с позиция 351'
363	Доставка и монтаж на нова дървена стреха, вкл. боядисване и челна дъска								позиция 363 започва успоредно с позиция 356'
364	Доставка и монтаж на покривна табакера	бр.	1						позиция 364 започва 1 ден преди началото на позиция 355'
365	Доставка и полагане на топлоизолация минерална вата 10 см. - твърда, с коефициент на топлопреминаване 0,035 W/mK върху таванска плоча, вкл. циментово лепило	м2	300,8	електрическа бъркалка 1 бр	1	111	114	4 дни	позиция 365 започва след позиция 355'
366	Полагане на армирана циментова замазка с мрежа от арматура	м2	300,8	бетопомпа 1 бр	1	115	115	1 ден	позиция 366 започва след позиция 365
367	Доставка и полагане на и топлоизолация минерална вата 12 см. под таванска плоча в стълбищна клетка	м2	23,5	винтоверт 1 бр	1	115	116	2 дни	позиции 367-368 започват след позиция 365
368	Доставка и монтаж на два пласта пожароустойчив гипсокартон (окачен таван) стълбищна клетка	м2	23,5						
369	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS - 5 см. по стени стълбищна клетка над таванска плоча, вкл. дюбелиране, един пласт стъклотекстилна мрежа,циментово лепило и циментова шпаклюка	м2	51	електрическа бъркалка 1 бр, перфоратор 1 бр	2	117	119	3 дни	позиция 369 започва след позиция 368
370	Демонтаж на съществуваща дървена дограма	м2	126	зъгошлайф 1 бр, винтоверт 2 бр	3	96	105	10 дни	позиции 370-372 започват успоредно с позиция 349
371	Доставка и монтаж на 6-камерна PVC дограма с двоен стъклопакет и K стъкло с коеф. на топлопреминаване 1,4 W/m2K.	м2	118,8						
372	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с прекъснат термомост и коеф. на топлопреминаване 2,2 W/m2K	м2	7,2						
373	Обработване на отвори на врати и прозорци на сменена дограма - външно	м	506,46	електрическа бъркалка 1 бр	1	105	119	15 дни	позиция 373 започва 1 ден преди края на позиции 370-372
374	Доставка и монтаж на противопожарни врати EI 60.	бр.	3	перфоратор 1 бр	1	167	167	1 ден	позиция 374 започва след позиции 398-399
375	Доставка и монтаж на фасадно скеле								позиция 375 започва успоредно с позиция 349
375'	Демонтаж на фасадно скеле								позиция 375' започва след позиция 425
376	Доставка и монтаж на подпрозоречни профили от алуминий с шир. до 30 см. - външни	м.	57,9						позиция 376 започва 1 ден преди позиция 381
377	Частично очукване и изкъпване по фасада с варociментова мазилка	м2	10						позиция 377 започва 1 ден преди края на позиции 96-105
378	Полагане на дълбоко проникващ грунд преди полагане на топлоизолация	м2	703,24						позиция 378 започва след позиция 377
379	Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10 см. по фасади и еркери, вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, лепило и циментова шпаклювка.	м2	494	електрическа бъркалка 1 бр, перфоратор 1 бр	2	108	122	15 дни	позиция 379 започва след позиция 378
380	Доставка и полагане на топлоизолация по цокъл XPS - 8 см. с коеф. на топлопродимост 0,034 W/mK , вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, ръбохранители, лепило и шпаклювка	м2	77,95	електрическа бъркалка 1 бр, перфоратор 1 бр	2	111	115	5 дни	позиция 380 започва 3 дни след началото на позиция 379
381	Обръщане на нова дограма с EPS 2 см. и коеф. на топлопроводимост 0,035 W/mK, шпаклювка с мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, грундиране и силикатна мазилка.	м	403,6	електрическа бъркалка 1 бр, перфоратор 1 бр	2	114	123	10 дни	позиция 381 започва 6 дни след началото на позиция 381
382	Обръщане на нова дограма с XPS 2 см. и коеф. на топлопроводимост 0,034 W/mK, шпаклювка с мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, грундиране и мозаечна мазилка.	м	102,86	електрическа бъркалка 1 бр, перфоратор 1 бр	2	113	115	4 дни	позиция 382 започва 2 дни след началото на позиция 380
383	Доставка и полагане на противопожарни ивици от минерална вата 10 см. с коеф. на топлопроводимост 0,038, с плътност мин. 100 кг./куб.м., вкл. метални дюбели-хоризонтална с шир. 20 см. и 2 бр. вертикални с ширина 50 см.	м2	30	електрическа бъркалка 1 бр, перфоратор 1 бр	2	111	113	3 дни	позиция 383 започва 3 дни след началото на позиция 379
384	Шпаклювка, грундиране и силикатна мазилка по отвори на съществуваща дограма - външно	м	198,5	електрическа бъркалка 1 бр	1	124	130	7 дни	позиция 384 започва след позиция 381
385	Доставка и полагане на силикатна мазилка, вкл. грундиране	м2	494	електрическа бъркалка 1 бр	1	126	140	15 дни	позиция 385 започва 2 дни след началото на позиция 384
386	Направа на холкер между стена и земна основа	м	104,85						позиция 386 започва 2 дни преди началото на позиция 382
387	Доставка и полагане на мозаечна мазилка	м2	77,95	електрическа бъркалка 1 бр, перфоратор 1 бр	2	145	149	5 дни	позиция 387 започва след позиция 375'
388	Обработка на видима армировка по чела на тераси	м.	25					2 дни	позиция 388 започва след позиция 377
389	Демонтаж и монтаж на теракот - етап 1 демонтаж	м2	97,51					3 дни	позиция 389 започва след позиция 349
389'	Демонтаж и монтаж на теракот - етап 2 монтаж			машина за рязане на плочки 1 бр, електрическа	2	125	128	4 дни	позиция 389' започва след 5 дни след началото на позиция 391'
390	Доставка и полагане на теракот	м2	71,4	машина за рязане на плочки 1 бр, електрическа	2	128	132	5 дни	позиция 390 започва 2 дни преди края на позиция 391'
391	Демонтаж, доставка и полагане на фаянс - етап 1 демонтаж	м2	212,22						позиция 391 започва успоредно с позиция 389
391'	Демонтаж, доставка и полагане на фаянс - етап 2 монтаж			машина за рязане на плочки 1 бр, електрическа	2	120	129	10 дни	позиция 391' започва след позиция 373
392	Боядисване на стени	м2	1460,41	електрическа бъркалка 1 бр	1	138	157	20 дни	позиция 392 започва 8 дни след началото на позиция 393
393	Боядисване на тавани	м2	666,82	електрическа бъркалка 1 бр	1	130	144	20 дни	позиция 393 започва 2 дни след началото на позиция 390
394	Демонтаж, доставка и монтаж на дървени врати	бр.	12	перфоратор 1 бр	1	155	158	4 дни	позиция 394 започва 3 дни преди края на позиция 392
395	Прогонване ,ремонт на механизми и боядисване на съществуващи дървени врати	бр.	49						позиция 395 започва след позиция 394
396	Демонтаж, доставка и полагане на балатум - етап 1 демонтаж	м2	255,27						позиция 396 започва след позиция 355'

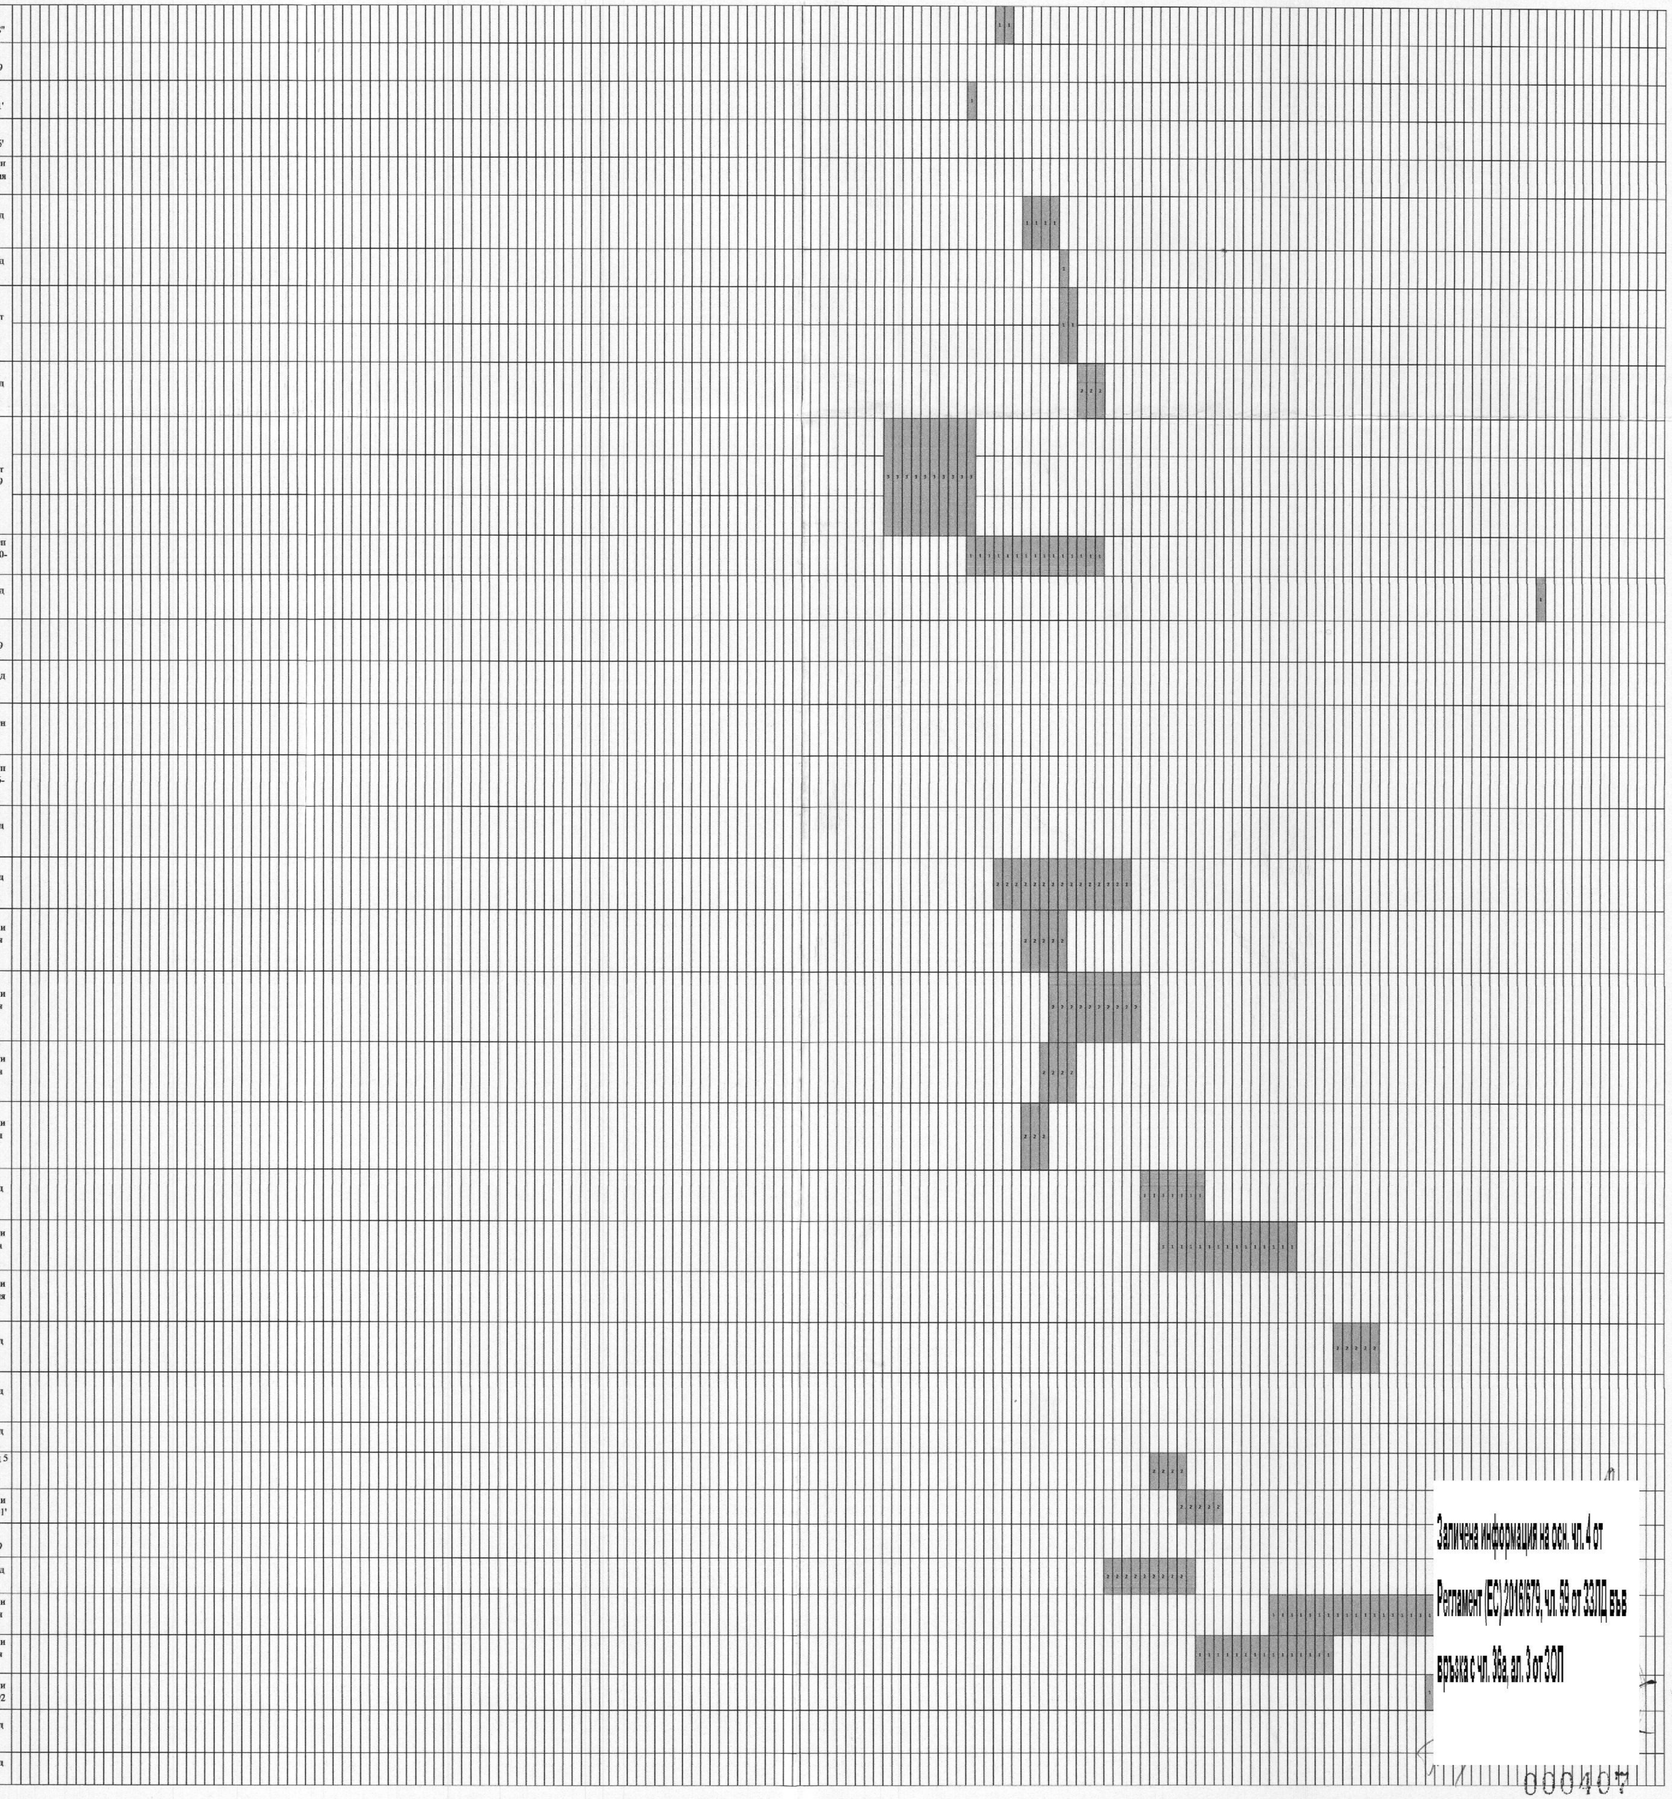

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД, вр.чл. 2ж, ал. 3 от ЗОП

000407

396'	Демонтаж, доставка и полагане на балатум - етаж 2 монтаж	м2	2,7+26,7						позиция 396' започва след позиция 396
397	Доставка и полагане на ламинат	м2	33,9						позиция 397 започва след 396'
398	Доставка и монтаж на на вътрешни преградни стени PVC -единично стъкло	м2	18,1	перфоратор 1 бр	1	164	166	3 дни	позиции 398-399 започват след позиция 395
399	Доставка и монтаж на вътрешни PVC врати между спални и занимални-1,6/2,00-единично стъкло	бр.	2						
400	Доставка и монтаж на наклонена платформа за движение по наклона на стълбищното рамо	бр.	1						позиция 400 започва 5 дни преди края на подобект 1
II	ВиК								
401	Ремонт и демонтаж поцинковани тръби ,изкопни работи,разбиване на бетон и тух.зидиастилкии възстановяването им.	м	33	къртач 1 бр	1	106	110	5 дни	позиция 401 започва след позиции 402-403
402	Демонтаж СКи други	бр.	17	къртач 1 бр	1	104	106	3 дни	позиции 402-403 започват след позиция 349'
403	Демонтаж кух и душ. смесители	бр.	9						
404	Доставка и монтажтръбиPP32 мм	м	4	машина за PP тръби 1 бр, винтоверт 1 бр	2	107	109	3 дни	позиции 404-411 започват след позиции 402-403
405	Доставка и монтаж тръби PP25 мм	мл	25						
406	Доставка и монтаж тръби PP20 мм	мл	20						
407	Доставка и монтажСК ф 2"	бр	1						
408	Доставка и монтажСК 2" с изп.	бр.	1						
409	Доставка и монтажСК1 ¼"	бр.	3						
410	Доставка и монтажСК¾"	бр.	5						
411	Доставка и монтажСК½"	бр	1						
412	Доставка и монтаж кух. и душ смесители	бр.	9	перфоратор 1 бр	1	136	137	2 дни	позиция 412 започва 3 дни след края на позиция 390
413	Доставка и монтажтерморегулатор	бр.	2	перфоратор 1 бр, винтоверт 1 бр	2	107	109	3 дни	позиции 413-415 започват успоредно с позиции 401-411
414	Доставка и монтажизвиртна клапа2"	бр.	1						
415	Доставка и монтаж филтър 2"	бр.	1						
416	Дезинфекция на водопроводната инсталация	бр.	1						позиция 416 започва след позиция 401
417	Канализационна инсталация	мл	32	къртач 1 бр	1	106	108	3 дни	позиции 417-418 започват успоредно с позиция 401
418	Ремонт и подмяна на тръби и фас.частивключително изкопни работи,разбиване на бетон и тух.зид , настилкии възстановяването им.	мл	10						
419	Демонтаж тоалетна мивка,кл.седало,подови сифони	бр.	3	къртач 1 бр	1	102	105	4 дни	позиция 419 запова след позиция 391
420	Демонтаж водосточни улеи и тръби ф100 мм	мл	147						позиции 420-421 започват след позиция 375
421	Демонтаж казанчета водосточни	бр	6						
422	Доставка и монтаж PVC ф50 мм	мл	10						позиция 422 започва 2 дни след началото на позиция 401
423	Доставка и монтаж мазиноуловител	бр.	1						позиция 423 започва след позиция 412
424	Доставка и монтаж на тоалетна мивка комплект и клозетно седало комплект с казанче	бр.	3	перфоратор 1 бр	1	139	139	1 ден	позиция 424 започва след позиция 423
425	Доставка и монтаж на водосточни тръби, ф 100	мл	43						позиция 425 започва след позиция 385
426	Доставка и монтаж водосточни улуци ф 100	мл	105,85						позиции 426-427 започват успоредно с позиция 356 '
427	Доставка и монтаж водосточни казанчета	бр.	6						
428	Доставка и монтаж подов сифон ф 100 мм	бр	2						позиции 428-429 започват след позиции 413-415
429	Доставка и монтаж сифон за мивка	бр	10						
III	ЕЛЕКТРО								
	Осветителна инсталация								
430	Демонтаж осв.тела	бр.	103						позиция 430 започва 5 дни преди началото на позиция 393
431	Доставка осв.тела LED 120 sm. 18 VV IP 34	бр.	10						позиции 431-432 започват 1 ден след края на позиция 392
432	LED плафониери Ф300 24VV	бр.	93						
433	Монтаж осв.тела	бр.	103	винтоверт 1 бр	1	160	161	10 дни	позиция 433 започва след позиции 431-432
434	Демонтаж ключове	бр.	32						позиция 434 започва след позиция 430
435	Доставка ключове – обикновен	бр.	20						позиции 435-436 започват в последния ден на позиция 392
436	Доставка ключове - сериен	бр.	12						
437	Монтаж ключове	бр.	32	винтоверт 1 бр	1	158	159	2 дни	позиция 437 започва след позиции 435-436
	Силова инсталация								
438	Доставка на профил PVC 20/20 мм.	м.	25	винтоверт 1 бр	1	123	125	3 дни	позиции 438-443 започват 2 дни преди началото на позиция 430
439	Монтаж на профил PVC 20/20 мм.	м.	25						
440	Доставка на проводник СВТ 3x1.5 кв.мм.	м.	35						
441	Монтаж на проводникСВТ 3x1,5 кв.мм.	м.	35						
442	Свързване	бр.	4						
443	Демонтаж и монтаж на контакти	бр.	12						
	Ел.табла								
444	Демонтаж съществ.предпазители	бр.	129	винтоверт 1 бр	1	126	130	5 дни	позиции 444-449 започват след позиции 438-443
445	Доставка авт.предпазители C60N 25A	бр.	120						
446	Доставкана авт. прдпазител C60N 63A	бр.	9						
447	Шина тоководеща 1м, трифазна	бр.	15						
448	Монтаж предпазители	бр.	129						
449	Освежаване табла	бр.	5						
450	Проверка заземление на ГРТ	бр.	1						позиция 450 започва след позиции 444-449
	Мълниезащитна уредба								
	Демонтажни работи								
451	Демонтаж на бетонна стомана Ф 8 мм.	м.	120						

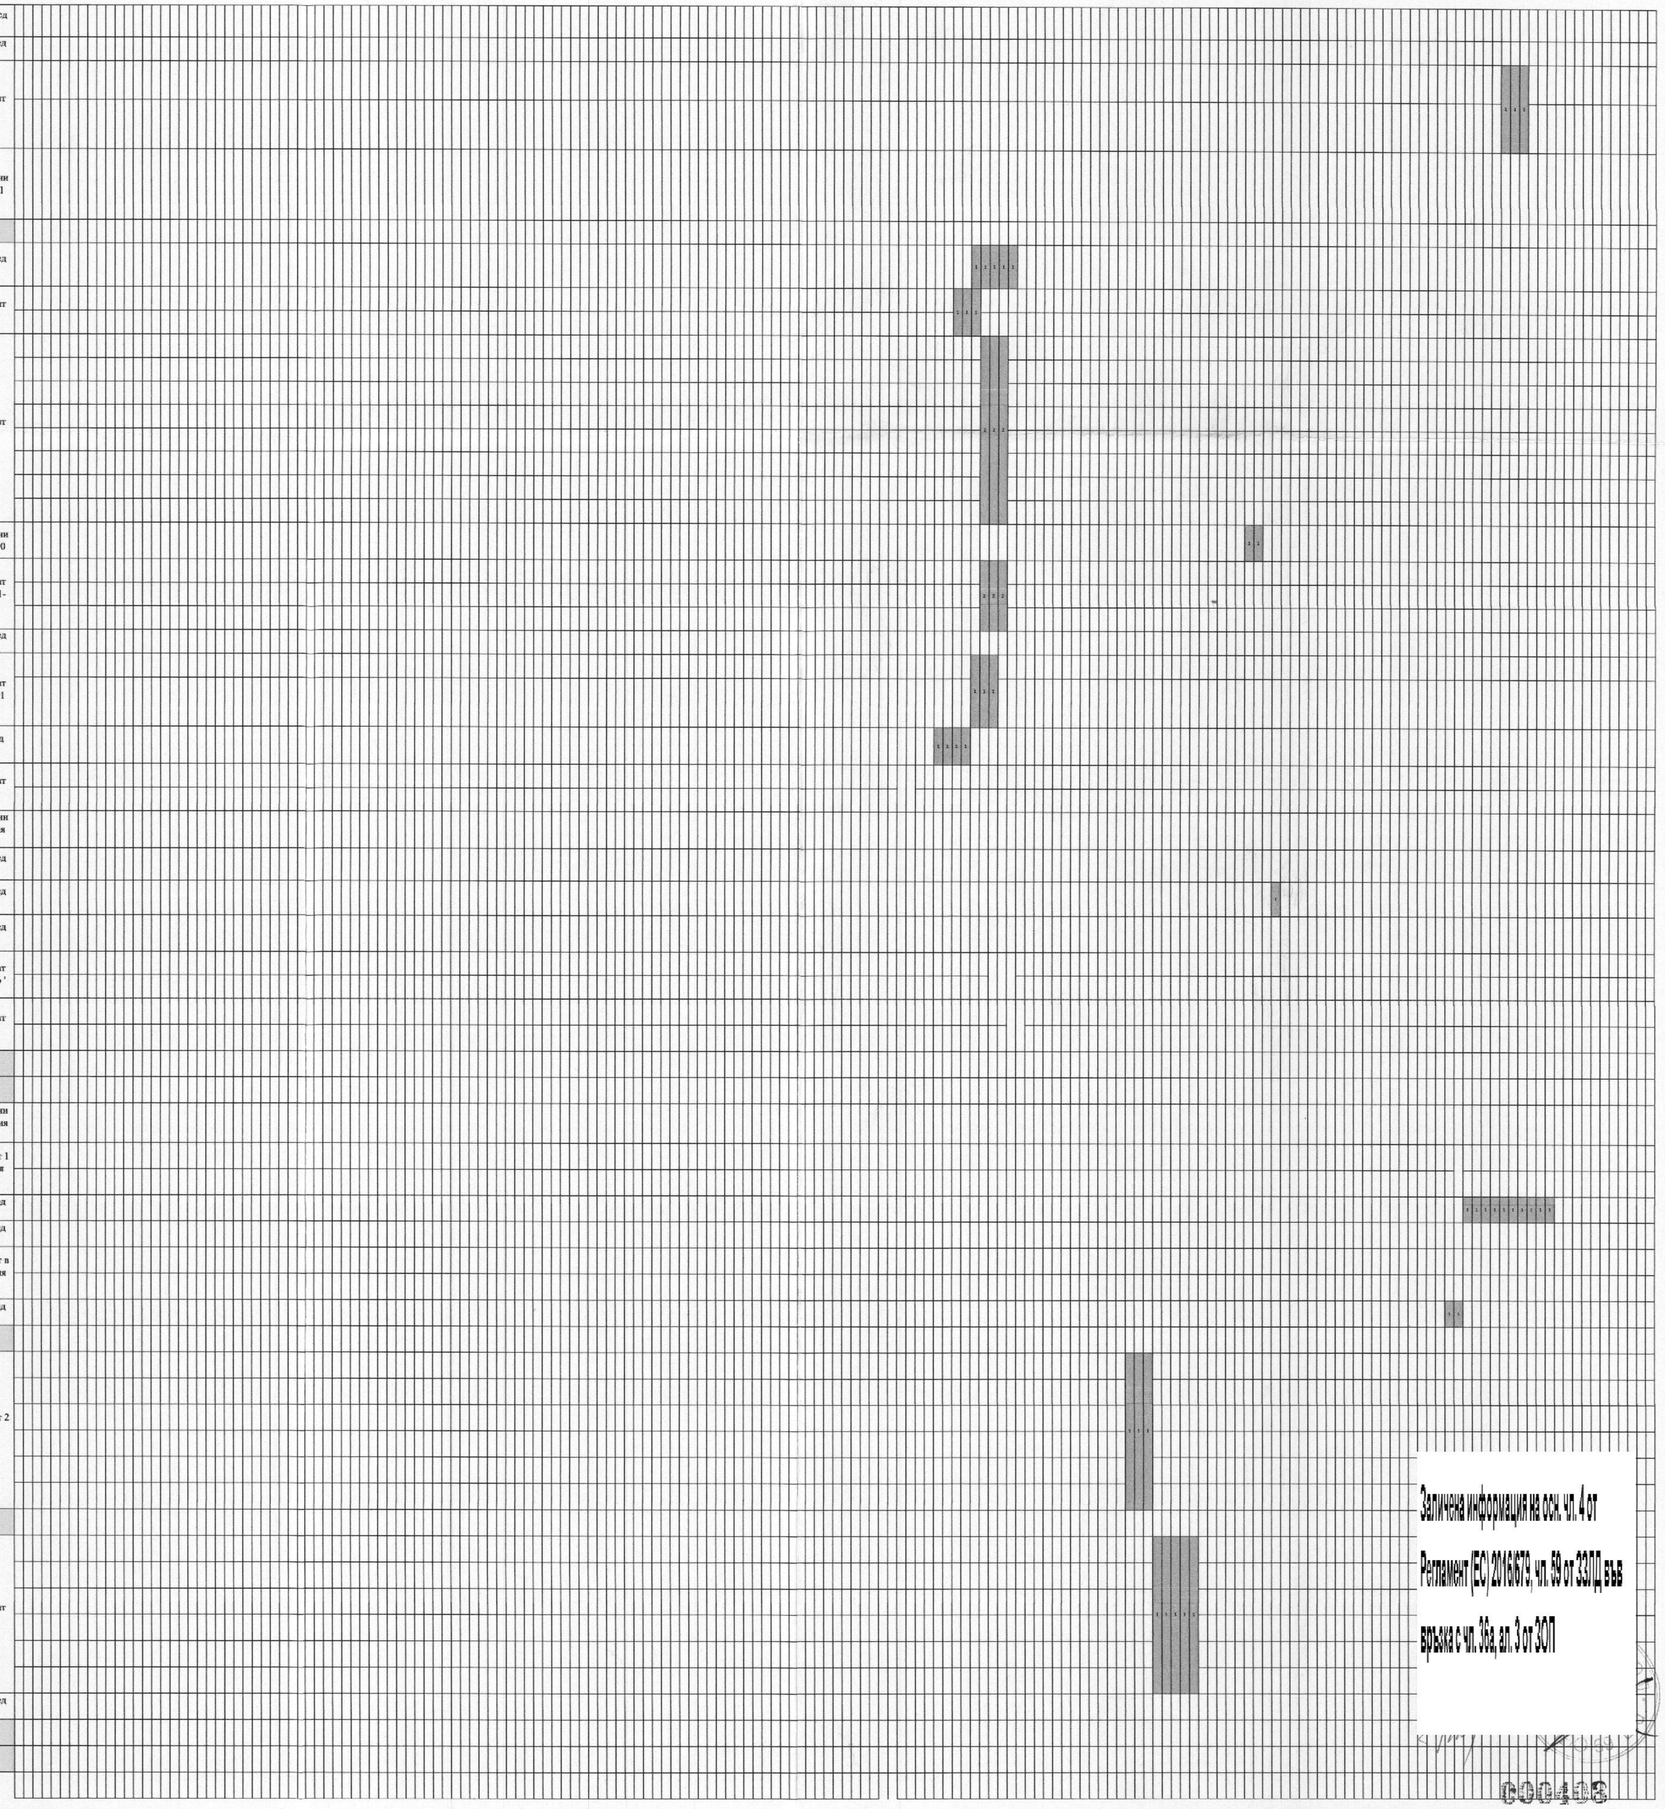

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 9ал. 3 от ЗОП

452	Демонтаж на Колчета	бр.	120						позиции 451-453 започват успоредно с позиция 349
453	Демонтаж на прът 4 м.	бр.	1						
	Монтажни работи								
454	Доставка мълниеприемник с изпреварващо действие	бр.	1			111	111	1 ден	позиции 454-455 започват след позиция 355'
455	Монтаж мълниеприемник с изпреварващо действие	бр.	1						
456	Проводник алум.Ф8 с PVC	м.	60			111	111	1 ден	позиция 456 започва успоредно с позиции 454-455
457	Крепежни елементи за скатен покрив	бр.	30	перфоратор 1 бр, къртач 1 бр	2	112	112	1 ден	
458	Полагане проводник	м.	60			112	112	1 ден	
459	Направа заземление с преходно съпротивл.до 20ома	бр.	2						позиции 457-463 започват след позиция 456
460	Доставка на ревизионна кутия200/400/100	бр.	2						
461	Монтаж на ревизионна кутия200/400/100	бр.	2	винтоверт 1 бр	1	112	112	1 ден	
462	Доставка на прав съединител	бр.	2						
463	Монтаж на прав съединител	бр.	2						
464	Пусковоналадъчни работи	бр.	10						позиции 464-465 започват след позиция 457-463
465	Измерване на заземление на мълниезащита	бр.	1						
IV	Пожарна безопасност								
	Пожароизвестителна инсталация								
466	Доставка и полагане на кабел J-Y/L/Y 2x0,50 мм	м.л.	600						
467	Доставка и полагани на кабелен канал 25x16,5мм	м.л.	300	перфоратор 1 бр винтоверт 1 бр	2	126	135	10 дни	позиции 466-468 започват след позиции 438-443
468	Доставка и полагани на кабелен канал 100x100x50мм	м.л.	10						
469	Пожароизвестителна централа SmartLine 020/4 -4 зони	бр.	1						
470	Разширител 8 зони за SmartLine 020/4	бр.	1						
471	Акумулаторна батерия 12v/7Ah	бр.	2						
472	Пожароизвестителоптично-димен D 9000SR с монтажна основа D9000	бр.	53						
473	Пожароизвестителтермодиференц D 9000T с монт. Основа D9000	бр.	3						позиции 469-478 започват 2 дни след края на позиция 392
474	Пожароизвестител ръчен с нечуплив елемент Teletek	бр.	4						
475	Пожароизвестителкомбиниран D 9000DT с монт. Основа D9000	бр.	1						
476	Електронна сирена флаш вътрешна SV2002F	бр.	4						
477	Електронна сирена с флаш лампа AH-03127-BS	бр.	1						
478	Изнесен светлинен сигнализатор	бр.	8						
	Монтаж на съоръжения								
479	Пожароизвестителна централа SmartLine 020/4 -4 зони	бр.	1						
480	Разширител 8 зони за SmartLine 020/4	бр.	1						
481	Пожароизвестителоптично-димен с монтажна основа	бр.	53						
482	Пожароизвестител ръчен с нечуплив елемент IC0020 INIM	бр.	4						
483	Пожароизвестителтермодиференц D 9000T с монт. основа	бр.	3						
484	Електронна сирена флаш вътрешна SV2002F	бр.	4	перфоратор 1 бр, винтоверт 1 бр	2	161	166	5 дни	позиции 479-489 започват след позиции 469-478
485	Електронна сирена с флаш лампа AH-03127-BS	бр.	1						
486	Изнесен светлинен сигнализатор	бр.	8						
487	Суха разделка на кабел	бр.	68						
488	Прозвъняване жилата на контролните кабели	бр.	68						
489	Свързване на проводник към съоръжение без ухо	бр.	68						
490	Единични изпитания	бр.	10						позиция 490 започва след позиции 479-489
491	Направа на отвор в бетон и/или тухла	бр.	59	къртач 1 бр	1	100	102	3 дни	позиция 491 започва след позиция 389
492	72 часова проба	бр.	1						позиция 492 започва след позиция 490
	Противопожарно отклонение								
493	Изкопни работи	м2	2						
494	Демонтажводомерен възел10 м3	бр	1						
495	Изграждане на водомерна шахта	бр	1						
496	Изграждане на шахта за ПК 2"	бр	1	перфоратор 1 бр къртач 1 бр	2	100	102	3 дни	позиции 493-499 започват успоредно с позиция 491
497	Доставка и монтаж на комбиниран водомер 50 м3	бр	1						
498	Доставка и монтаж ПК2"	бр.	1						
499	Доставка и монтаж поц.тръба 2"	мл	3						
	Охранителни системи								
500	Изграждане на система за контрол на достъпа, в т.ч. и окабеляване	бр.	1						позиция 500 започва 5 дни преди края на подобект 1
V	ОВК								
	Вентилационнистени и умивални								
501	Доставка и монтаж осов вентилаторф150мм,250 м3/ч, 20 Pa., 24 вт. , 40 dB .	Бр.	2						
502	Доставка и монтаж на скоби от неръждаема стомана d/D = 60 / 165мм	бр.	4	перфоратор 1 бр винтоверт 1 бр	2	165	174	10 дни	позиции 501-505 започват 1 ден след края на позиция 395
503	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховодф 154 мм	м	1						
504	Доставка и монтаж на Z – носач от поц. ламарина	бр	4						
505	Метална конструкция за монтаж на вентилатора	кг	5						
	Вентилационнакухня								
506	Доставка и монтажАбсорбатор с 260 м3/ч, ф125мм, 65 dB, сменяеми филтри	бр	1						
507	Доставка и монтаж на скоби от неръждаема стомана d/D = 60 / 165мм	бр	4	перфоратор 1 бр винтоверт 1 бр	2	175	176	2 дни	позиции 506-509 започват след позиции 501-505
508	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховодф 154 мм	м	1						
509	Метална конструкция за монтаж на абсорбатора	кг	5						
Етап 3: Завършване на двата подобекта – тоест организация на етапа на предаване на обекта на Възложителя и постигане на проектни показатели, както и направа на необходимите тествания в приложимите случаи									
510	Провеждане на необходимите тествания и проби в случайните които те не са включени в КСС -то на двата обекта: ДГ „Мечо Пух" с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Градница, УПИ VII, кв.27 (подобект 2) и Г „Мечо Пух" с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево УПИ V кв.5 (подобект 1)община Севлиево								позиция 510 започва 1 ден след началото на позиции 506-509
511	Почистване и напускане на двата обекта: ДГ „Мечо Пух" с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Градница, УПИ VII, кв.27 (подобект 2) и Г „Мечо Пух" с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево УПИ V кв.5 (подобект 1)община Севлиево			бордови автомобил 1 бр	1	179	179	1 ден	позиция 511 започва в последния ден на позиция 510

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

| | | |

Диаграма на механизацията

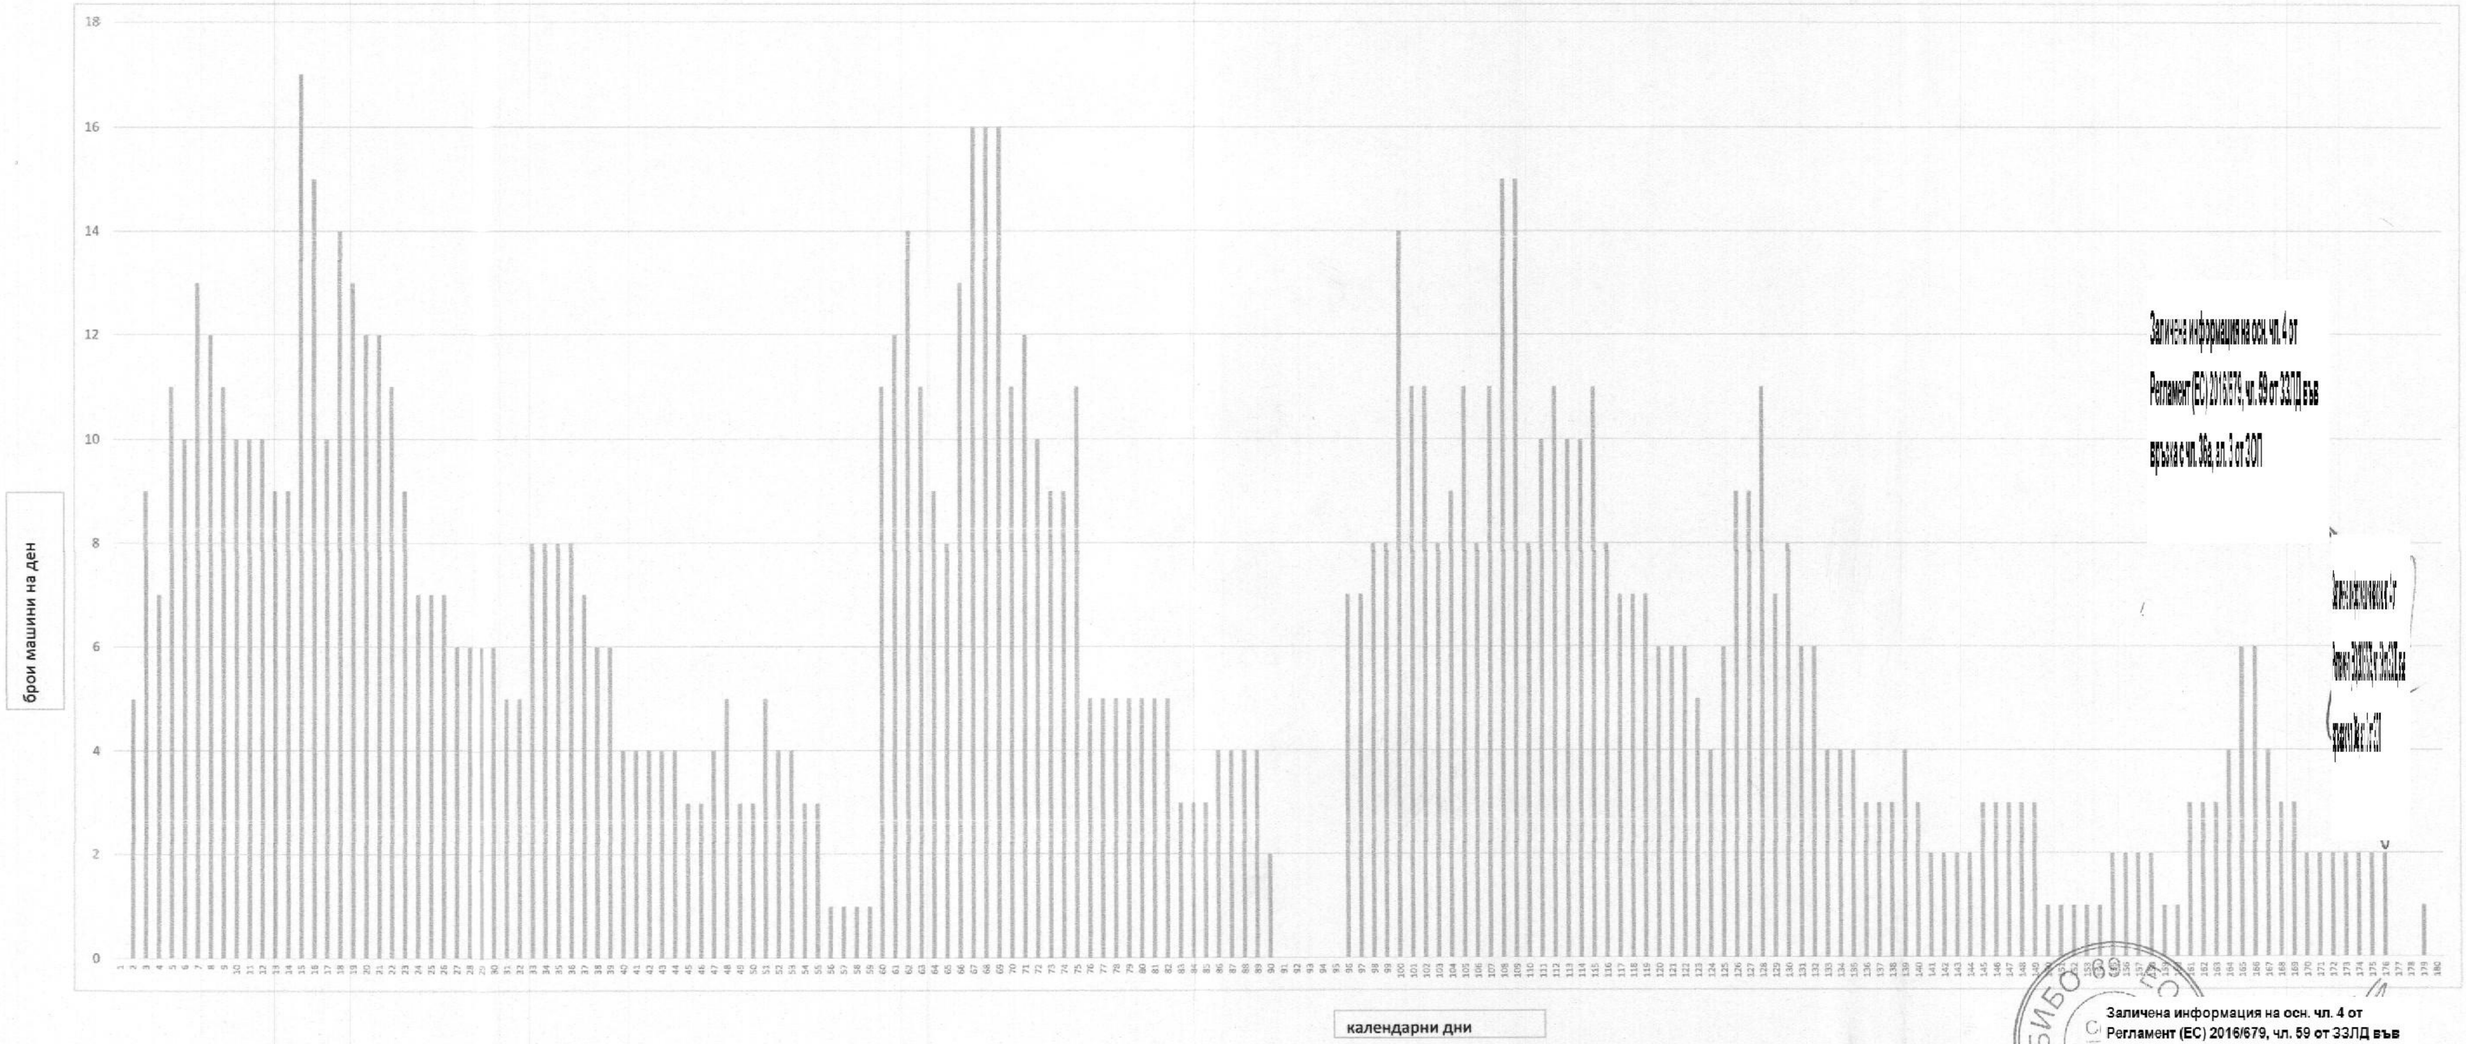

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Тодор Димитров
Управител

000411
