

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗПД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


427	Доставка и монтаж водосточни улуци ф 100	м	105,85	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО	работник тенекеджийски работи - 2 бр	2	водосточни улуци ф 100	108	109	2 дни	позиции 426-427 започват успоредно с позиции 356	поз. 356						
428	Доставка и монтаж водосточни казачета	бр.	6					водосточни казачета											
429	Доставка и монтаж подов сифон ф 100 мм	бр	2			работник Влк инсталации 2 бр	2	подов сифон ф 100 мм	110	111	2 дни	позиции 428-429 започват след позиции 413-415		поз. 413-415					
III ЕЛЕКТРО																			
Осветителна инсталация																			
430	Демонтаж осветл.	бр.	103	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО	работник електронинсталации 2 бр	2		125	129	5 дни	позиция 430 започва 5 дни преди началото на позиция 393	поз. 393						
431	Доставка осветл. тела LED 120 sm. 18 VV IP 34	бр.	10			работник електронинсталации 1 бр	1	осв. тела LED 120 sm. 18 VV IP 34	159	159	1 ден	позиции 431-432 започват 1 ден след края на позиция 392		поз. 392					
432	LED плафонери Ф300 24VV	бр.	93			работник електронинсталации 4 бр	4	LED плафонери Ф300 24VV	160	169	10 дни	позиция 433 започва след позиции 431-432							
433	Монтаж осветл.	бр.	103	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО	работник електронинсталации 2 бр	2		130	131	2 дни	позиция 434 започва след позиция 430	поз. 430						
434	Демонтаж ключове	бр.	32			работник електронинсталации 1 бр	1	ключове – обикновени	157	157	1 ден	позиции 435-436 започват в последния ден на позиция 392		поз. 392					
435	Доставка ключове – обикновени	бр.	20					ключове – сериен											
436	Доставка ключове - сериен	бр.	12	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО	работник електронинсталации 4 бр	4		158	159	2 дни	позиция 437 започва след позиции 435-436	поз. 436						
437	Монтаж ключове	бр.	32																
Силова инсталация																			
438	Доставка на профил PVC 20/20 мм.	м.	25	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО	работник електронинсталации 2 бр	2	профил PVC 20/20 мм.	123	125	3 дни	позиции 438-443 започват 2 дни преди началото на позиция 430	поз. 430						
439	Монтаж на профил PVC 20/20 мм.	м.	25																
440	Доставка на проводник СВТ 3x1,5 кв.мм.	м.	35					проводник СВТ 3x1,5 кв.мм.											
441	Монтаж на проводникСВТ 3x1,5 кв.мм.	м.	35	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО														
442	Свързване	бр.	4																
443	Демонтаж и монтаж на контакти	бр.	12					контакти											
Ел.табла				Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО	работник електронинсталации 2 бр	2		126	130	5 дни	позиции 444-449 започват след позиции 438-443	поз. 443						
444	Демонтаж съществ.предпазители	бр.	129					авт.предпазители С60N 25A											
445	Доставка авт.предпазители С60N 25A	бр.	120					авт. предпазители С60N 63A											
446	Доставката авт. предпазители С60N 63A	бр.	9	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО			Шина тоководеща 1м, трифазна											
447	Шина тоководеща 1м, трифазна	бр.	15																
448	Монтаж предпазители	бр.	129																
449	Осигуряване табла	бр.	5	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО			боя											
450	Проверка изземване на I P1	бр.	1		работник електронинсталации 2 бр	2		131	131	2 дни	позиция 450 започва след позиции 444-449	поз. 449							
Мълнинсвирателна уредба																			
Демонтажни работи				Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО	работник електронинсталации 2 бр	2		96	97	2 дни	позиция 451-453 започват успоредно с позиция 349	поз. 349						
451	Демонтаж на бетоноа стомана Ф 8 мм.	м.	120																
452	Демонтаж на Колчета	бр.	120																
453	Демонтаж на прът 4 м.	бр.	1	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО														
Монтажни работи																			
454	Доставка мълнинприсемник с изпреварващо действие	бр.	1		работник електронинсталации 2 бр	2	мълнинприсемник с изпреварващо действие	111	111	1 ден	позиции 454-455 започват след позиция 355	поз. 355							
455	Монтаж мълнинприсемник с изпреварващо действие	бр.	1	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО	работник електронинсталации 1 бр	1	Проводник алум.Ф8 с PVC	111	111	1 ден		позиция 456 започва успоредно с позиции 454-455						
456	Проводник алум.Ф8 с PVC	м.	60			работник електронинсталации 1 бр	1	Крепежни елементи за скатен покрив	112	112	1 ден								
457	Крепежни елементи за скатен покрив	бр.	30	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО	работник електронинсталации 2 бр	2		112	112	1 ден		поз. 456						
458	Поставяне проводник	м.	60			работник електронинсталации 2 бр	2	кутия метала ревизионна кутия 200/400/100	112	112	1 ден	позиции 457-463 започват след позиция 456							
459	Направя на заземление с изредно съпротива до 20ома	бр.	2																
460	Доставка на ревизионна кутия200/400/100	бр.	2	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО			прав съединителя											
461	Монтаж на ревизионна кутия200/400/100	бр.	2																
462	Доставка на прав съединителя	бр.	2																
463	Монтаж на прав съединителя	бр.	2	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ЕЛЕКТРО	работник електронинсталации 2 бр	2		113	113	1 ден	позиция 464-465 започват след позиции 457-463	поз. 463						
464	Пусковозащитни работи	бр.	10																
465	Измерване на заземление на мълнинсвирател	бр.	1																
IV Пожарна безопасност				Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	работник електронинсталации 4 бр	4	кабел J-Y/L/Y 2x0,50 мм	126	135	10 дни	позиции 466-468 започват след позиции 438-443	поз. 443						
466	Доставка и поставяне на кабел J-Y/L/Y 2x0,50 мм	м.л.	600					кабелен канал 25x16,5мм											
467	Доставка и поставяне на кабелен канал 25x16,5мм	м.л.	300					кабелен канал 100x100x50мм											
468	Доставка и поставяне на кабелен канал 100x100x50мм	м.л.	10	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	работник електронинсталации 1 бр	1	Пожарноизвестителна централа SmartLine 020/4 -4 зони	160	160	1 ден	позиция 469-478 започват 2 дни след края на позиция 392	поз. 392						
469	Пожарноизвестителна централа SmartLine 020/4 -4 зони	бр.	1					Разширител 8 зони за SmartLine 020/4											
470	Разширител 8 зони за SmartLine 020/4	бр.	1					Акумулаторна батерия 12v/7Ah											
471	Акумулаторна батерия 12v/7Ah	бр.	2	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ			Пожарноизвестително-димен D 9000SR с монтажна основа D9000											
472	Пожарноизвестително-димен D 9000SR с монтажна основа D9000	бр.	53					Пожарноизвестителтермодиференц D 9000T с монт. Основа D9000											
473	Пожарноизвестителтермодиференц D 9000T с монт. Основа D9000	бр.	3					Пожарноизвестител ръчен с нечулив елемент Teletek											
474	Пожарноизвестител ръчен с нечулив елемент Teletek	бр.	4	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	работник електронинсталации 4 бр	4	Пожарноизвестителкомбиниран D 9000DT с монт. Основа D9000	161	166	5 дни	позиция 479-489 започват след позиции 469-478	поз. 478						
475	Пожарноизвестителкомбиниран D 9000DT с монт. Основа D9000	бр.	1					Електронна сирена: фазн вътрешна SV2002F											
476	Електронна сирена: фазн вътрешна SV2002F	бр.	4					Електронна сирена с фазн лампа AH-03127-BS											
477	Електронна сирена с фазн лампа AH-03127-BS	бр.	1	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ			Електронна сирена с фазн лампа AH-03127-BS											
478	Износен светлинен сигнализатор	бр.	8					Износен светлинен сигнализатор											
Монтаж на съоръжения				Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ														
479	Пожарноизвестителна централа SmartLine 020/4 -4 зони	бр.	1																
480	Разширител 8 зони за SmartLine 020/4	бр.	1																
481	Пожарноизвестително-димен с монтажна основа	бр.	53	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ														
482	Пожарноизвестител ръчен с нечулив елемент IC0620 INIM	бр.	4																
483	Пожарноизвестителтермодиференц D 9000T с монт. основа	бр.	3																
484	Електронна сирена: фазн вътрешна SV2002F	бр.	4	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ														
485	Електронна сирена с фазн лампа AH-03127-BS	бр.	1																
486	Износен светлинен сигнализатор	бр.	8																
487	Сува разветка на кабел	бр.	68	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ														
488	Прозъняване жълти на контролните кабели	бр.	68																
489	Свързване на проводник към съоръжение без ука	бр.	68																
490	Електрична изпитателна	бр.	10	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП Влк - ПРОТИВОПОЖАРНО ОТКЛОНЕНИЕ	работник Влк инсталации 2 бр и общ работник строителство на стради 2 бр	3		100	102	3 дни	позиция 493-499 започват успоредно с позиция 491	поз. 491						
491	Направя на отвор в бетон и/или тухла	бр.	59																
492	72 часова проба	бр.	1					работник електронинсталации 2 бр						2		168	171	4 дни	позиция 492 започва след позиция 490
Противопожарно отклонение																			
493	Изкопни работи	м2	2																
494	Демонтажводомер вълн10 м3	бр	1	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП Влк - ПРОТИВОПОЖАРНО ОТКЛОНЕНИЕ			работник Влк инсталации 2 бр и общ работник строителство на стради 1 бр						3		100	102	3 дни	позиция 493-499 започват успоредно с позиция 491
495	Изграждане на водомерна шахта	бр	1																
496	Изграждане на шахта на ПК 2"	бр	1			комбиниран водомер 50 м3													
497	Доставка и монтаж на комбиниран водомер 50 м3	бр	1	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКНП Влк - ПРОТИВОПОЖАРНО ОТКЛОНЕНИЕ				ПК2"										
498	Доставка и монтаж ПК2"	бр.	1						пощ.труба 2"										
499	Доставка и монтаж пощ.труба 2"	мл	3																
Охранителни системи																			

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗПД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОН

500	Изграждане на система за контрол на достъпа, в т.ч. и окабеляване	бр.	1	Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството и Експерт по безопасност и здраве	ЕКИП ЕЛЕКТРО	работник електромонтажи 4 бр	4	материали необходими за система за контрол на достъпа	172	176	5 дни	позиция 500 започва 5 дни преди края на подобект 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-----	---	-----	---	---	--------------	------------------------------	---	---	-----	-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Диаграма на работната ръка

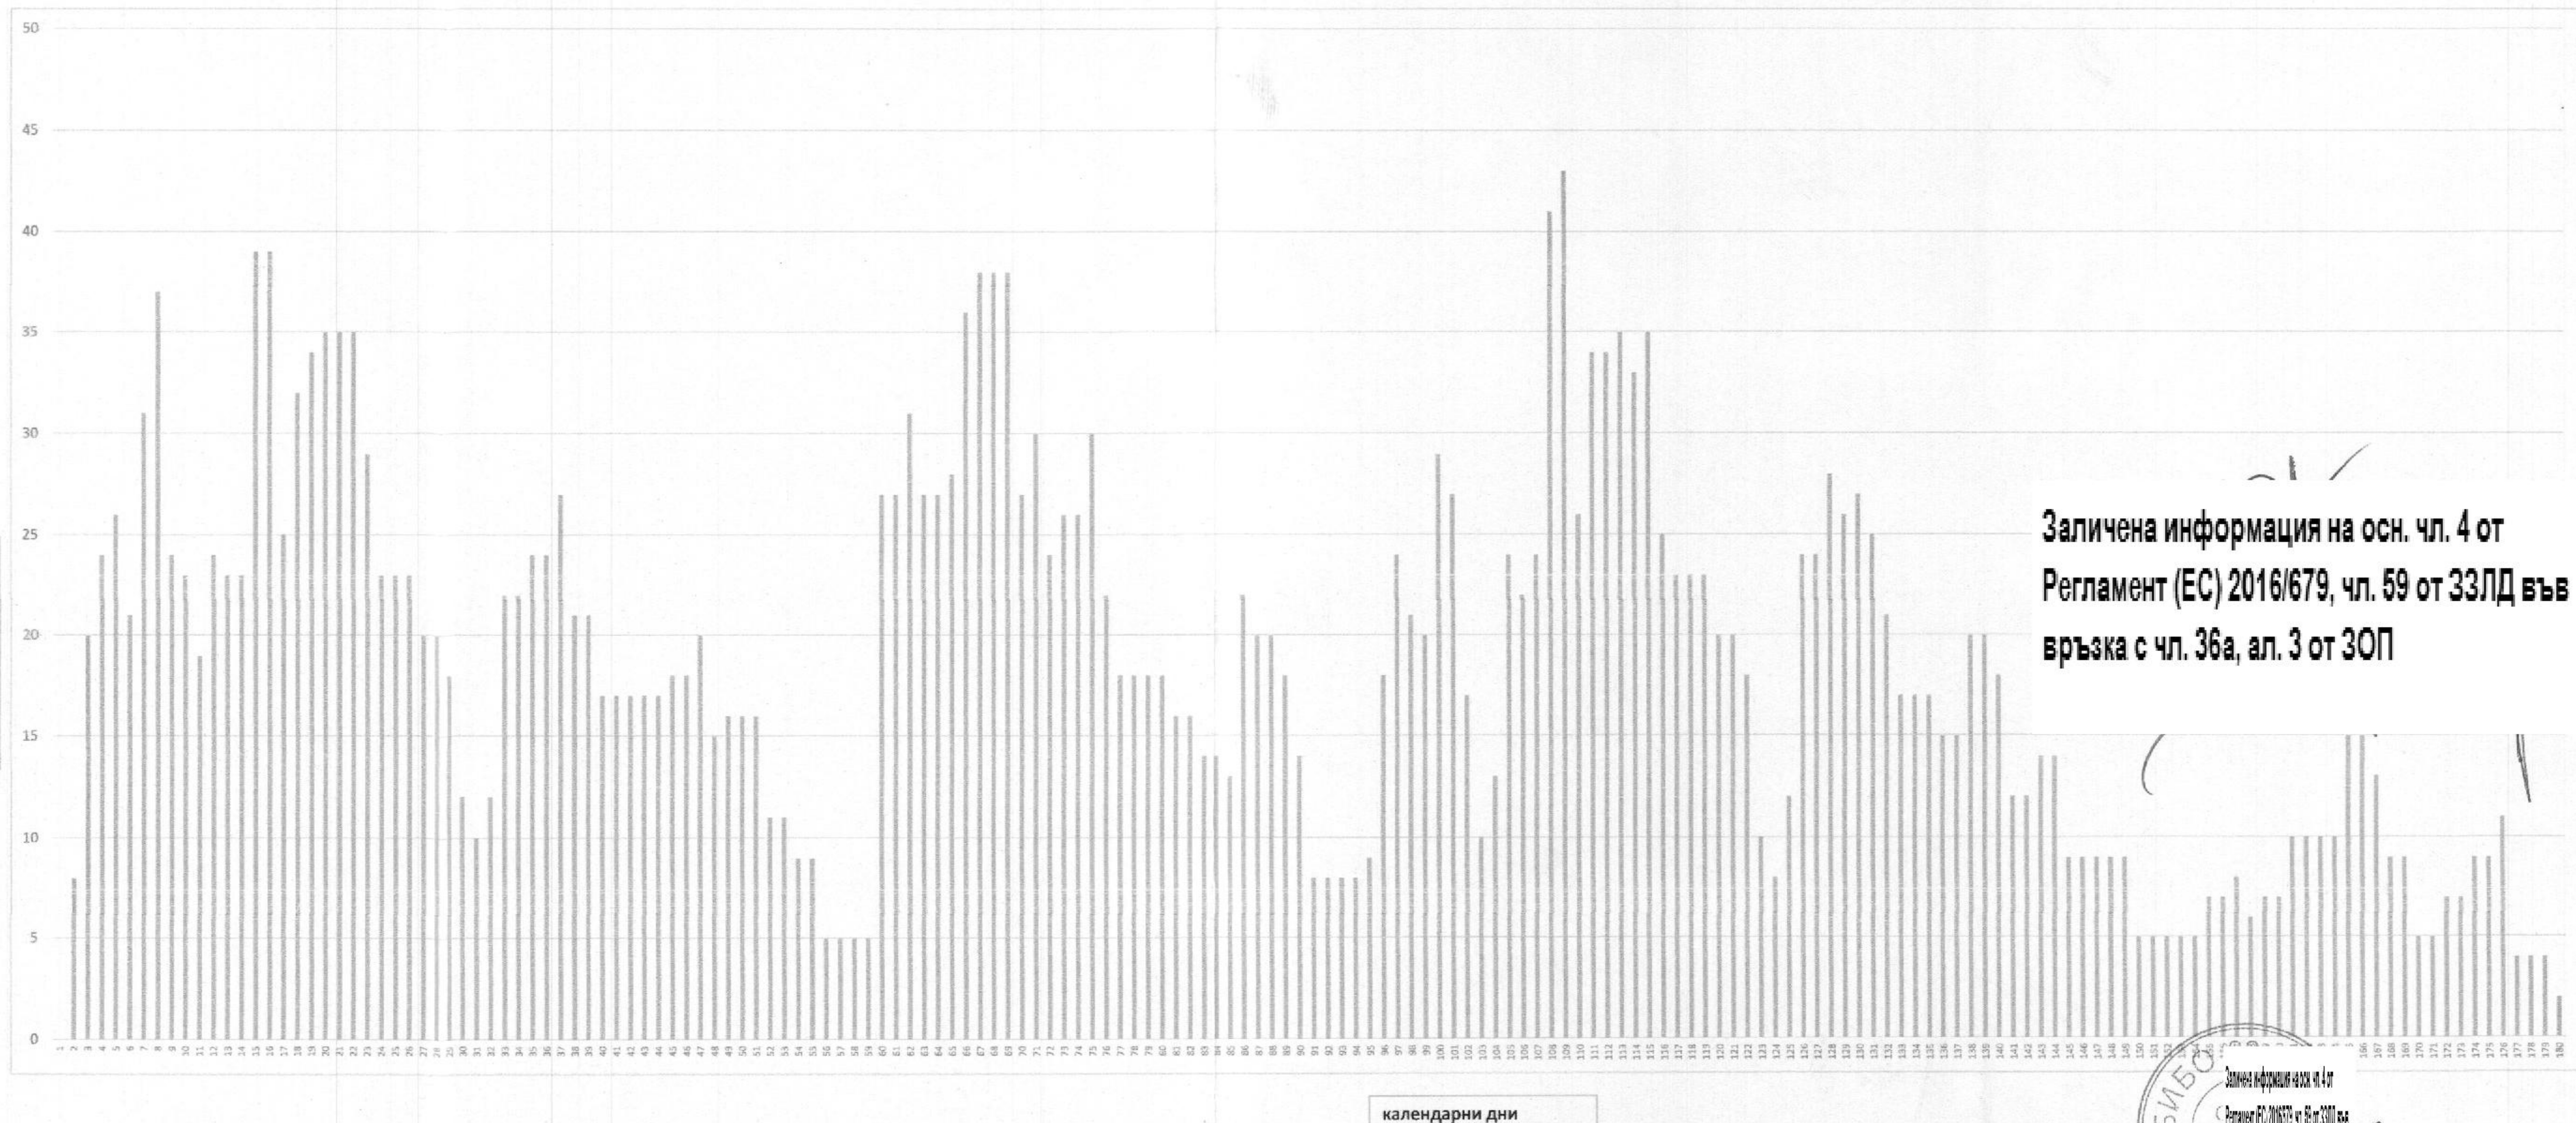

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Тодор Димитров
Управител

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

000398

„Основен ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево“

000399

[illegible]

142	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	8	перфоратор 1 бр	1	60	69	10 дни	позиции 142-143 започват успоредно с позиции 118-135	
143	Метална конструкция за подвески	кг	50							
144	Пробиване отвори в бетон 20x20 см	бр.	7							
145	Също , но в тухла 25 см , 20x20 см	бр.	12							
146	Направа хидравлична проба за доказване плътността на инсталацията	мл	292						позиция 146 започва след позиции 82-98	
147	Направа топла проба за доказване нормалното затопляне на радиаторите	бр	27						позиция 147 започва след позиция 146	
Бойлер 200 л. – Тръбна мрежа и арматура.										
148	Бойлер 200л.с една серпентина и слагаревател	бр.	1	машинна за полиетиленови тръби 1 бр, перфоратор 1 бр	2	61	63	3 дни	позиции 148-152 започват 1 ден след позиции 99-110 и позиции 118-135	
149	Полиетиленова тръба с AL-вложка тип Rex-Al Ф 26x3 мм.	мл	18							
150	Правя връзка Rex-Al-външна резба 26x3- 3/4 "	бр.	4							
151	Спирателен кран 3/4"	бр.	4							
152	Автоматичен обезвъздушителя 1/2"	бр.	2							
153	Тръбна топлоизолация от полиетилен с външен защитен слой Ф 28 мм, деб.15 мм	мл	18						позиция 153 започва след позиция 155	
154	Метална конструкция за подвески	кг.	5	перфоратор 1 бр	1	60	60	1 ден	позиция 154 започва 1 ден преди позиции 148-152	
155	Направа на хидравлична проба за доказване плътността на инсталацията	мл	18						позиция 155 започва след позиции 148-152	
Вентилация тоалетни и умивални										
156	Доставка и монтаж осов вентилатор ф150мм, 250 м3/ч, 20 Ра., 24 вт. , 40 dB .	бр.	2	перфоратор 1 бр	1	66	67	2 дни	позиции 156-160 започват след позиция 153	
157	Доставка и монтаж на скоби от нерждаема стомана d/D = 60 / 165мм	бр.	4							
158	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф 154 мм	м	1							
159	Доставка и монтаж на Z – носач отпоц. ламарина	бр	4							
160	Метална конструкция за монтаж на вентилатора	кг	5							
Вентилация кухня										
161	Доставка и монтаж Абсорбатор с 260 м3/ч, ф125мм, 65 dB, сменяеми филтри	бр	1	перфоратор 1 бр	1	68	69	2 дни	позиции 161-164 започват след позиции 156-160	
162	Доставка и монтаж на скоби от нерждаема стомана d/D = 60 / 165мм	бр	4							
163	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф 154 мм	м	3							
164	Метална конструкция за монтаж на абсорбатора	кг	5							
Газова инсталация										
165	Доставка и монтаж на газов котел 23,8 kW	бр.	1	перфоратор 1 бр, винтоверт 1 бр	2	75	89	15 дни	позиции 165-200 започват 5 дни след началото на позиции 82-98	
166	Доставка и монтаж на газов котел 45 kW	бр.	1							
167	Доставка на затворен разширителен съд 150 л.	бр.	1							
168	ЦП-1-високоэффективна помпа с електронно регулиране и автоматичен икономичен режим Клас на енергийна ефективност "А" произведено в ЕС с параметри:1,5м3/ч,2,5м.в.ст...P=9-85W,Rp1"	бр.	1							
169	ЦП-2-високоэффективна помпа с електронно регулиране и автоматичен икономичен режим Клас на енергийна ефективност "А" произведено в ЕС с параметри:0,8м3/ч,2,0м.в.ст...P=9-85W,Rp1"	бр.	1							
170	ЦП-2-високоэффективна помпа с електронно регулиране и автоматичен икономичен режим Клас на енергийна ефективност "А" произведено в ЕС с параметри:0,8м3/ч,2,0м.в.ст...P=9-85W,Rp1"	бр.	1							
171	Направа водоразпределител Ф 100 мм. L=1,5 м.	бр.	2							
172	Доставка кран ДУ 15 мм.	бр.	4							
173	Също, но ДУ 25 мм.	бр.	8							
174	Също, но ДУ 32мм.	бр.	11							
175	Доставка вентил 1"	бр.	2							
176	Доставка филтър 1"	бр.	2							
177	Също, но 1 1/4"	бр.	1							
178	Доставка извирател нентил Ду 25 мм.	бр.	2							
179	Също, но Ду 32 мм.	бр.	1							
180	Доставка предпазен нентил Ду 25 мм, 8 bar.	бр.	1							
181	Доставка вентил 1/2".	бр.	1							
182	Доставка автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	7							
183	Доставка на табло за автоматично управление	бр.	1							
184	Доставка термометър до 120 C	бр.	2							
185	Доставка манометър до 0,6 MPa	бр.	2							
186	Доставка холелтри 1"	бр.	5							
187	Също, но 1 1/4"	бр.	6							
188	Направа пущери 1/2"	бр.	12							
189	Също, но 1"	бр.	8							
190	Също, но 1 1/4"	бр.	12							
191	Доставка тръба 1"	мл	7							
192	Също, но 1 1/4"	мл	18							
193	Полиетиленова тръба с Al-вложка тип Rex-AlØ26x3mm	мл	18							
194	Също, но Ф 32 мм., деб. 3 мм.	мл	25							
195	Тръбна изолация от полиетилен с външен защитен слой Ф 28 ммм., с деб. 15 мм.	мл	16							
196	Също, но Ф 35 мм., деб. 15 мм.	мл	30							
197	Също, но Ф 42 мм., деб. 15 мм.	мл	18							
198	Също, но Ф 108 мм., деб. 20 мм.	мл	3							
199	Доставка на полипропиленова тръба PP-1 1/4"	мл	10							
200	Също, но PP-1 1/2"	мл	10							
Управление на газови котли										

Залпичена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 58 от 33ПД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

1000403

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗПД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

